



BRIGHT FUTURE FOR CHILDREN

SAAMA DEDA

Inhoudelijke en financiële eindrapportage

4e fase meerjarenproject




Realisatie door: Stichting Bright Future for Children i.s.m.
de vereniging DECASA van Abéné in Senegal

Inhoud Fase 4: Bouw multifunctioneel gebouw voor een lagere school in de
wijk Medina in Abéné, Senegal

Doorlooptijd: januari 2023 t/m december 2024 (24 maanden)

Algemene informatie

Land :	Nederland (land projectuitvoering: Senegal)
Naam van de organisatie:	Stichting Bright Future for Children
Contact adres Stichting:	Houtstraat 14, 6001SJ Weert
Telefoonnummer:	06 51510474
E-mail :	info@brightfutureforchildren.nl
Website :	https://www.brightfutureforchildren.nl/
KvK:	71717463
ANBI:	De stichting is als ANBI aangemerkt.
Korte samenvatting project:	Ontwikkelen van een 2e dubbelstromige lagere school in Abéné
Verantwoording:	De bestaande lagere school in Abéné is overvol en kan de huidige en verwachte onderwijsvraag niet meer opvangen.
Fasering project	Het project Saama Deda wordt fasegewijs gerealiseerd. <ul style="list-style-type: none">- In de eerste fase (2019) werden 2 klaslokalen gebouwd.- In de 2^e fase (2020-2021) werden 3 klaslokalen gebouwd- In de 3^e fase (2021-2022) werden de laatste klaslokalen gebouwd.- In de 4e fase werd een multifunctioneel gebouw gerealiseerd voor de huisvesting van leerlinggebonden en leerlingverbonden functies.
Inhoud eindrapportage	Deze eindrapportage heeft betrekking op de 4e fase (afsluitende) fase van het meerjarenproject Saama Deda, op de laatste investeringen en de feestelijke inhuldiging van de school.
Financiering project:	Het project werd gefinancierd door Stichting Bright Future for Children op basis van inkomsten uit eigen acties, persoonlijke donaties en fondsenwerving.
Lokale partner:	Het project wordt in samenwerking met de vereniging DECASA gerealiseerd.
Bankdetails	
Bank:	Rabobank
IBAN:	NL 89 RABO 0330517708
Rekeninghouder:	Stichting Bright Future for Children

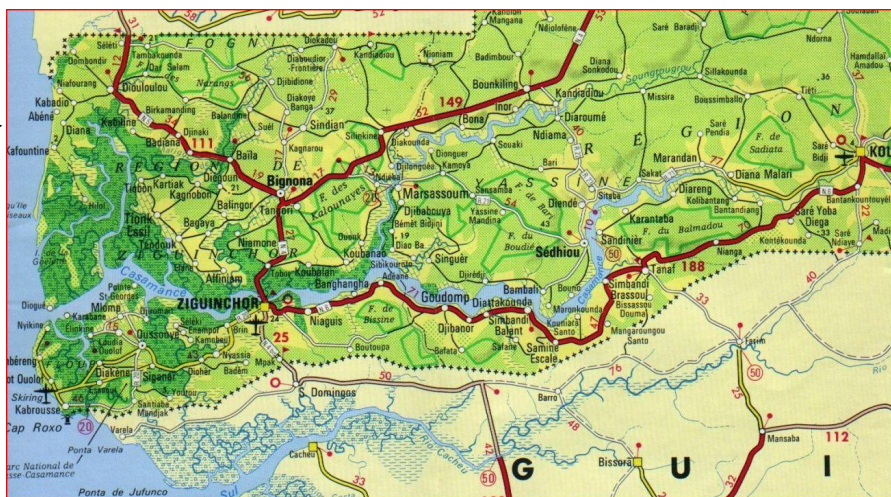

Regio Casamance in Zuid Senegal, met aanduiding projectlocatie Abéné

Inhoudsopgave

I.	Inhoudelijke eindrapportage	4
1.	Omschrijving van het project	4
2.	Chronologisch overzicht en beeldverslag realisatie	4
II.	Laatste investeringen	9
III.	Feestelijke inhuldiging	10
IV.	Financiële verantwoording bouw multifunctionele voorziening	13
V.	Projectbeheer	13
1.	Verantwoordelijken	14
2.	Projectorganisatie, informatievoorziening, controle	14
3.	Projectcontrole	15
4.	Evaluatie	15

I. INHOUDELIJKE EINDRAPPORTAGE

1. Omschrijving van het project.

SAAMA DEDA, fase 4

Het project vormt de afsluitende 4^e fase van een meerjarenproject dat onder de noemer "SAAMA DEDA" ("de toekomst maak je zelf") wordt uitgevoerd. Het betreft de bouw van een multifunctionele voorziening voor de huisvesting van leerlinggebonden en leerlingverbonden functies van een lagere school in de wijk Medina in Abéné, Senegal.

De multifunctionele voorziening bevat de volgende functies: *directiekamer (11,55 m²); magazijn voor archief en leermiddelen (11,55 m²) lerarenkamer (24 m²), die tevens als ICT-lokaal dienst doet om laatstejaars de kans te geven zich voor te bereiden op het gebruik van computers in het vervolgonderwijs; bibliotheek (15 m²), ook gebruikt voor onderzoek- en verwerkingsopdrachten in groepjes; een toilet voor de leerkrachten en een lokaal voor individuele leerling-begeleiding en oudergesprekken (9 m²).*

Aanleiding en voorgaande projectfasen

- Door de sterk toegenomen onderwijsvraag was het noodzakelijk om het aantal lagere scholen in Abéné, Senegal uit te breiden. Ofschoon er geen geld was om een school te bouwen, besloten de dorpsraad en de oudervereniging in 2016 toch om een tweede lagere school te ontwikkelen in de wijk Medina. De interim directeur kreeg de opdracht om voor de bouw sponsors te zoeken en in afwachting daarvan in hutten van palmladeren les te geven. In 2017 financierde een in de regio werkzame stichting één klaslokaal.
- De nieuwe school werd al in de loop van 2018 erkend door de Senegalese overheid. Daardoor werd een directeur en het vereiste aantal leerkrachten aangesteld en werd de school opgenomen in het reguliere staatstoezicht door de inspectie van onderwijs.
- In 2019 financierde stichting Bright Future for Children, in samenwerking met de Zwitserse vereniging Bolo Diem Kanam, de bouw van 2 klaslokalen en een toiletblok en besloot de Senegalese overheid, geheel onverwacht, de school met drie klaslokalen te ondersteunen. Daardoor waren er in juli 2020 in totaal 6 volwaardige klaslokalen beschikbaar.
- Omdat het aantal leerlingen snel toenam was het noodzakelijk om weer tijdelijke hutten van palmladeren te maken. Daarom besloot het bestuur van stichting Bright Future for Children om in 2020 drie extra klaslokalen te bouwen, waardoor er in totaal 9 klassen waren.
- In 2021-2022 werden de laatste drie klassen gebouwd. In totaal beschikte de school dan over 12 klaslokalen voor de huisvesting van een volwaardige dubbelstroom.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de lagere schoolleeftijd van Abéné, een dorp van de gemeente Kafountine in Zuid-Senegal. Ofschoon de school in de wijk Medina wordt gebouwd, is de school bestemd voor alle kinderen van Abéné en ook voor kinderen van het zeer nabij gelegen Diannah.

2. Chronologisch overzicht en beeldverslag projectrealisatie

In het navolgende overzicht doen we fasegewijs verslag van de projectrealisatie met inbegrip van de vele vertragingen waarmee we te kampen hadden.

1e fase (van januari tot half september 2023)

Toen de aannemer in januari 2023 met de bouw wilde beginnen bleek dat er onenigheid was ontstaan over de plaats waar het multifunctionele gebouw zou moeten komen. De jongeren van de wijk hadden bij de wijkraad en de chef van het dorp een bezwaar ingediend omdat ze vreesden dat ze hun voetbalterrein op het schoolplein zouden kwijtraken. Omdat de school een gemeenschapsvoorziening is zijn eind maart de vertegenwoordigers van alle groeperingen, die formeel bij het besluit betrokken moeten worden naar de school gekomen om de situatie ter plaatse te bekijken. Dit waren: de chef van het dorp, vertegenwoordigers van de wijkraad, de jongerenraad van de wijk, de ouderraad van de school, het toeziend beheerscomité van de school, de directie en de voorzitter van DECASA.



Om aan de jongeren tegemoet te komen namen ze het besluit dat het gebouw bij de entree van het terrein gebouwd kon worden. Op de foto's is te zien dat dit naast de zijkant is van de 3 klaslokalen, die in de 3e fase van het project werden gebouwd. Maar omdat de aannemer ondertussen een andere opdracht had geaccepteerd kon de bouw pas in juni, met 5,5 maand vertraging, van start gaan.



De fundering was begin juli klaar. Daarna werden holle bakstenen voor de muren gemaakt. Deze waren eind juli 1,5 m. hoog opgetrokken. Door het regenseizoen was het van eind juli tot half september 2023 weer niet mogelijk om verder te bouwen. Door de veelvuldige regen groeiden rondom en in het gebouw volop planten.



2e fase (van oktober 2023 tot eind januari 2024)



Begin oktober kon het dak eindelijk worden gelegd. De projectmanager keurde echter de constructie af. Omdat het dak ook als plafond dienst doet moeten de binnenmuren tot aan het plafond worden opgetrokken opdat de binnenruimten onderling van elkaar worden gescheiden.

Bij een puntdak zouden sommige binnenmuren zeer hoog worden. Dat zou er niet uitzien en tevens de kosten verhogen. Daarom moest het puntdak in een schuin aflopend dak veranderd worden.



Begin november was het dak aangepast en ontvingen we van de projectmanager een brief dat hij alles in het werk zou stellen om de bouw op 15 november 2023 op te leveren. Maar kort daarna bleek dat er flinke problemen waren met de levering van metaal, waardoor de projectmanager zijn belofte niet kon nakomen. Begin januari was er weer metaal beschikbaar voor de constructie van de ramen en de deuren. De verankering hiervan in de muren is noodzakelijk om het gebouw binnen en buiten verder af te werken.



Op 27 januari 2024 waren de ramen en deuren klaar. Nadat ze in de grondverf waren gezet werden ze een week later in de muren verankerd.

3e fase (van februari 2024 tot september 2024)


Eind januari dachten we dat we dat we het meeste oponthoud wel hadden gehad en dat het gebouw snel kon worden afgewerkt. Maar dat viel tegen. De onrust bij de presidentsverkiezingen in april/mei, daklekkages, termieten en werklieden, die hun werkafspraken niet altijd nakwamen maakten dat het gebouw pas in de eerste week van september kon opgeleverd worden. Hierna een beeldverslag van het verloop.



In juni en juli werd de septische put gemaakt voor de afvoer van het toilet en de wastafel.




In het gebouw werden de muren en de betonnen vloer afgesmeerd en de deuren geplaatst. Hierbij deed zich het probleem voor dat termieten de houten binnendeuren zodanig hadden aangetast dat ze door metalen deuren moesten worden vervangen. Dat leverde € 150 meerkosten op. Aan de voorkant van het gebouw werd een betonnen perron gemaakt om vuil (zand/bladeren) en water tijdens het regenseizoen buiten de deur te houden. Dat het regenseizoen ondertussen was begonnen is te zien aan de groene aanslag, die door opspattend water onderaan op de buitenmuren was gekomen.

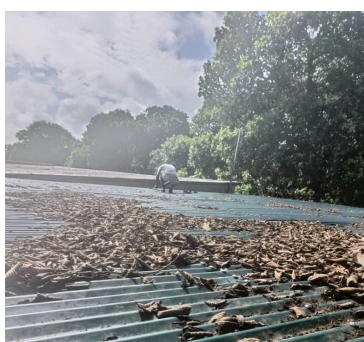

Toen de schilder in augustus werd gevraagd om de binnen- en buitenkant van het gebouw te verven stelde hij vast dat het dak op verschillende plaatsen lekte. Daardoor waren enkele binnenmuren vochtig geworden. De lekkages moesten eerst hersteld worden zodat de muren konden opdrogen alvorens ze te schilderen.



De buitenmuur werd wit gegrond en daarna bruin/rood geverfd.

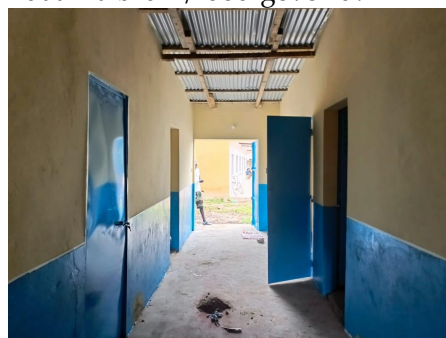

Ook de binnenmuren kregen eerst een witte grondlaag. Daarna werden ze okergeel geverfd en voorzien van een afwasbare blauwe band. De deuren, ramen en luiken werden gegrond en blauw afgewerkt.



De blauwe band aan de onderkant werd aan de buitenkant doorgetrokken. Daardoor vormt het gebouw een eenheid met de klaslokalen aan de linkerkant van het gebouw, die tijdens fasen werden gerealiseerd. We zijn trots op het resultaat. Gelukkig werden de lekkages tijdig vóór het schilderwerk vastgesteld.

II. LAATSTE INVESTERINGEN

Na de oplevering van het multifunctionele gebouw hebben we tussen oktober 2024 en januari 2025 het meerjarenproject Saama Deda afgerond met de aanschaf van meubilair en apparatuur voor een bedrag van € 3.037, dat vanuit een donatie van Vincentius Vereniging Schijndel (€ 1.000), Coreness B.V. (€ 1.000) en particuliere donaties (€ 1.037) werd gefinancierd. We waren verheugd dat ze nog voor de feestelijke opening van de school waren afgeleverd. Dit met uitzondering van 9 laptops, die door Nystar Netherlands B.V. waren gedoneerd. Deze werden pas halverwege februari overhandigd omdat de boot waarmee ze verscheept waren er veel langer over had gedaan dan we hadden gedacht.



9 laptops gedoneerd door Nystar Netherlands B.V.



3 tafels en 15 stoelen



Een toilet en wastafel voor het personeel



Een kopieerapparaat



Printpapier, inktpatronen, snijmachine en bindmachine



III. FFEESTELIJKE INHULDIGING

Het is in Senegal gebruikelijk dat een school officieel wordt ingehuldigd door de bevolking en lokale en regionale hoogwaardigheidsbekleders. De feestelijke opening vond plaats op 25 januari 2025. Omdat deze gebeurtenis de feitelijk afsluiting van het schoolproject markeert, doen we in deze eindrapportage ook hiervan verslag.

De officiële inhuldiging van de school werd onder begeleiding van DECASA door het lerarencollege, de wijkraad en de oudervereniging georganiseerd. We stelden er € 1.440 uit particuliere docanties voor beschikbaar. Met dit bedrag werden alle genodigden voorzien van een drankje en een warme rijst-maaltijd, werd een feesttent en een geluidsinstallatie gehuurd, werden de onkosten van de uitgenodigde pers voldaan en werden de percussiegroepen, die het feest 'savonds kwamen opluisteren vergoed.

De ceremonie kwam kort na de middag op gang met een bezoek aan de klaslokalen en aan het kersvers opgeleverde multifunctionele gebouw door de aanwezige hoogwaardigheidbekleders: de burgemeesters van Kafountine en Diouloulou, de onderprefect, de chef en imam van Abéné, de inspecteur van onderwijs en de voorzitters van onze partnerorganisatie DECASA en van Stichting Bright Future for Children.




Daarna volgde een lange reeks toespraken van alle hiervoor genoemden, de voorzitter van de oudervereniging en de leerlingen. We werden meermalen bedankt voor de bouw en uitrusting van de school.



De dankbaarheid van de school bleek ook uit een verrassing die de directeur voor de drie aanwezige bestuursleden in petto had. Ze kregen vóór de ceremonie een afrikaans shirt met het verzoek dat tijdens de plechtigheid te dragen. De shirts waren identiek aan de kleding van het personeel van de school. "Jullie horen bij ons team en zo willen we dat duidelijk maken", aldus schooldirecteur Abdou Coly.



Om de dankbaarheid ook een formeel tintje te geven ontvingen we van de inspecteur van het onderwijs, de directeur van de school en de chef van het dorp ook een diploma van erkentelijkheid voor wat we voor het onderwijs in het departement van Bignona hebben gedaan.



Tijdens het officiële gedeelte van het programma werd er naast de school in de schaduw hard gewerkt door tientallen vrouwen. Die maakten er een heerlijke maaltijd, thieb-au-djap (rijst met rundvlees), klaar, die na afloop van de ceremonie met smaak werd verorberd door de aanwezigen. Naast de al genoemde hoog-waardigheidsbekleders waren er veel ouders en heel veel leerlingen van de school aanwezig. Die genoten na de maaltijd ook van een muzikaal programma met de bijbehorende Kumpo.



Toespraak Seny Souané, voorzitter DECASA



De feestelijke opening van deze lagere school is het sluitstuk van een proces van integratie van de school in het nationale onderwijs-systeem. De school biedt zonder onderscheid aan alle kinderen onderwijs, dat een basis vormt voor hun professionele en maatschappelijke toekomst

Vanuit deze visie heeft onze partner Bright Future for Children uit Nederland sinds 2018 aanzienlijke financiële middelen ingezameld voor de financiering van 8 klaslokalen en een multifunctioneel gebouw. Ook heeft de stichting een grote hoeveelheid schoolmeubilair uitgedeeld in verschillende onderwijsinstellingen van het dorp Abéné namelijk de voorschoolse kinderopvang, de middelbare school, de technische beroepsschool en in het bijzonder in deze lagere school.

Ik dank, uit naam van de vereniging DECASA, zeer hartelijk onze partner voor de inspanningen die ze hebben geleverd. Ook dank ik de directeur, oudervereniging en het bestuur van de school voor hun geduld en begrip en roep hen op om de gebouwen, de apparatuur en het meubilair goed te onderhouden om er nog vele jaren van te kunnen genieten.

Toespraak Abdou Coly, directeur van de school



Vandaag vieren we een gebeurtenis, die voor altijd in de geschiedenis van onze school gegrift zal blijven. De school, die in 2015 met 3 klassen van palmladeren is gestart beschikt nu na 10 jaar over 12 klassen, die aan normen voldoen. Dit dank zij de vitaliteit van de bevolking en de vruchtbare samenwerking tussen stichting Bright Future for Children uit Nederland en de vereniging DECASA van Abéné. Samen hebben ze voor de school 8 klaslokalen gebouwd en een multi-functionele voorziening uitgerust met boekenkasten, 9 laptops, 3 tafels en 15 stoelen en een kopieer-, bind- en snijmachine. De klassen hebben ze voorzien van schoolbanken, tafeltjes en stoeltjes, kasten, bureau's, schoolborden en nog veel meer.

We zijn blij dat we hier vandaag een eerbetoon kunnen uitbrengen aan hun gezamenlijke inspanningen en danken tevens de talloze donateurs, die hun inspanningen mogelijk maakten. Ik kan de woorden niet vinden om hen te bedanken en onze grote blijdschap uit te drukken.

Geachte leden van Bright Future for Children en donateurs: uw bijdrage aan de ontwikkeling van onze school is van onschatbare waarde en gaat ons zeer aan het hart. We zullen de school goed onderhouden om hiermee goede leer en werkomstandigheden te waarborgen, zodat we de goede schoolresultaten, die we sinds 2018 behalen, blijven vasthouden.

Toespraak John van Heel, voorzitter Stichting Bright Future for Children



Toen we in 2016 met het gezin een bezoek brachten aan de lagere school van Abéné om schoolmaterialen te doneren konden we niet voorzien dat dit bezoek tot de bouw van deze school zou leiden. De directeur vertelde dat de school overvol was en dat daarom was besloten om in een andere wijk een 2e lagere school te beginnen. Omdat er geen geld was voor de bouw van klaslokalen had de ouderraad hutten van palmladeren gemaakt. Getroffen door deze nijpende situatie besloten we als gezin om ons voor deze nieuwe school in te spannen. Eind 2017 konden we de fundering van 2 klaslokalen financieren en ondertussen had ook de Stichting Vrienden van Kelediàng 1 klaslokaal gebouwd.

Omdat we beseften dat we als gezin niet in staat zouden zijn om het hele project te financieren hebben we in mei 2018 met enkele mensen, die al 20 jaar een intensieve band hadden met het dorp, Stichting Bright Future for Children opgericht. In 2019 konden we al met de Zwitserse vereniging Bolo Diem Kanam op de eerder gerealiseerde fundering de eerste 2 klaslokalen bouwen en een toiletblok. Om het eigenaarschap van het project lokaal te verankeren en het project over meerdere jaren te spreiden zijn we na de bouw van deze klaslokalen een partnerschap aangegaan met de lokale vereniging DECASA.

Eind 2019 verscheepten we schoolmeubilair en in 2020 en 2021 bouwden we telkens drie klaslokalen. Samen met de 3 klaslokalen, die de Senegalese overheid in 2019 had gebouwd, beschikte de school in november 2022 over alle 12 klaslokalen. Om alle kinderen een goede werkplek te geven zijn 50 extra schoolbankjes aangeschaft. Tenslotte hebben we in 2023 en 2024, op verzoek van de directeur en het lerarencollege, nog een multifunctioneel gebouw gefinancierd alsmede het daarin aanwezige meubilair. Het gebouw bevat een directiekamer, magazijn, lerarenkamer, gespreksruimte en een ruimte voor een schoolbibliotheek.

We hebben veel tegenslagen gehad, die veel tijdverlies opleverden en tot frustratie leidden. Maar dank zij het doorzettingsvermogen van onze partner DECASA is het project nu naar tevredenheid afgerond en kijken we met vreugde naar het resultaat.

We danken onze partner DECASA voor de vruchtbare samenwerking en in het bijzonder Seny Souané voor het voortreffelijke coördinerende werk. We danken dhr. Amadou Diabang, de chef van het dorp, voor het vertrouwen dat hij al jaren in ons stelt om in zijn dorp ontwikkelingen te ondersteunen. We danken de directeur, de leerkrachten, het schoolbestuur, de ouderraad en alle andere personen, die bij de bouw betrokken waren voor de goede samenwerking en hopen hartsgrondig dat de kinderen in deze school met enthousiasme een fundament kunnen leggen voor een mooie toekomst.

IV. FINANCIËLE VERANTWOORDING BOUW MULTIFUNCTIONELE VOORZIENING

Facturen en betalingsbewijzen			Bedrag	Bedrag
No factuur of betalingsbewijs	Begunstigde	Inhoud	FCFA	euro
factuur 718	Abdoulay Diallo	Diverse materialen	2.560.000	3.903
Betalingsbewijs 1	Médoune Diop	arbeidsloon maken fundering	400.000	610
Betalingsbewijs 2	Kalibou N'diaye	betaling ijzervlechter	200.000	305
Betalingsbewijs 3	Lamine Coly	Lading zand	200.000	305
Betalingsbewijs 4	Abdoulaye Diatta	arbeidsloon fundering vullen	260.000	396
Betalingsbewijs 5	Lamine Coly	Lading grind	250.000	381
Betalingsbewijs 6	Bacary Badji	arbeidsloon stenen maken dl 1	404.000	616
Betalingsbewijs 7	Bacary Badji	arbeidsloon stenen maken	304.000	463
Betalingsbewijs 8	Médoune Diop	arbeidsloon maken fundering	300.000	457
Betalingsbewijs 1	Yaya cisse	lading zand	200.000	305
Betalingsbewijs 2	Lamine ngor Diatta	spanten voor dak	675.000	1.029
Betalingsbewijs 3	Djibril ba	2 houten deuren	160.000	244
Betalingsbewijs 4	Yaya cisse	ladingen grind	200.000	305
Betalingsbewijs 5	Djibril ba	houtzaagwerk	20.000	30
Betalingsbewijs 6	Boucar sow	arbeidsloon dakdekker	300.000	457
Betalingsbewijs 7	Fallou SENE	sceptische put	1.020.000	1.555
Betalingsbewijs 8	INSA DRAME	buitencoating	200.000	305
Factuur N°000363A	IBRAHIMA DIALLO	dakplaten	52.000	79
Factuur N°0000185B	IBRAHIMA DIALLO	dakplaten	225.000	343
Factuur N°00000185	OUMAR BA	deuren en ramen in metaal	575.000	877
Factuur N°0000033	DIATTA ET FRERES	divers	881.400	1.344
Factuur Gie bleu Africa energie	BAE	Materialen en arbeidsloon	678.000	1.034
Totaal			10.064.400	15.343

Voor niet formeel geregistreerde leveranciers/arbeiders worden betalingsbewijzen opgemaakt voor geleverde producten/diensten. Betalingsbewijzen zijn telkens ondertekend door drie personen: de projectmanager, de begunstigde en de penningmeester van Decasa of de aannemer. Van materialen, die in een winkel werden aangeschaft, wordt een factuur opgemaakt. Bedragen zijn handmatig ingevuld op een voorbedrukt factuurblad.

Verantwoording financiering	FCFA	Euro	Koers
Totaal facturen betalingsbewijzen	10.064.400	15.343	1 € = 655,957
Meerkosten t.b.v. metalen deuren i.p.v. houten deuren	98.750	150	1 € = 655,957
Totaal werkelijke kosten	10.163.150	15.494	
Begroting op basis van kostenramingen voor aanvang	9.792.035	14.928	1 € = 655,957
Overschrijding begroting	371.115	566	1 € = 655,957
Financiering werkelijke kosten			
Via bank overgemaakt op 5 dec. 2022	4.873.885	7.430	1 € = 655,957
Overhandigd in jan. 2023 door voorz. J.van Heel	4.875.000	7.500	1 € = 650
Totaal gefinancierd	9.748.885	14.930	
Totaal werkelijke kosten	10.163.150	15.494	
Verschil financieringsbedrag / werkelijke kosten	-414.265	-631	1 € = 655,957
Via bank overgemaakt op 28-11-2023	315.515	481	1 € = 655,957
Via bank overgemaakt op 04-11-2024	98.750	150	1 € = 655,957
Verschil	0	0	

De werkelijke kosten waren € 566 hoger, wat we op het totaalbedrag acceptabel vonden.

Financiering

Nr.	Bron donaties	Bedrag
1.	Actie "Boeken Steunen Mensen" van Vincentiusvereniging Venlo (2022)	7.500
2.	Vincentius vereniging Schijndel (2023)	1.000
3.	De Nolte Stichting (2022)	2.500
4.	Sponsoropbrengsten Dakar Rally Race 22/23 van Kees en Jacobine Kamp (2023)	950
5.	Vincentius Vereniging Breda (2021)	2.500
6.	Particulieren (2023)	1.044
	Totale inkomsten aan donaties	15.494

V. Projectbeheer

1. Verantwoordelijken

De 4e fase van het meerjarenproject SAAMA DEDA is gerealiseerd door:

Stichting Bright Future for Children

Stichting Bright Future for Children wil een bijdrage leveren aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio Casamance in Zuid-Senegal. De stichting richt zich in het bijzonder op onderwijs en (beroeps-) vorming van jongeren om hen een goed toekomstperspectief te bieden. Alle leden van het bestuur hebben gedurende 15 jaar een intense band met het dorp Abéné, waar het project wordt gerealiseerd. Ze zetten zich vanuit deze verbondenheid in om de doelstellingen van de stichting te realiseren.

Organisation pour le développement de la Casamance (DECASA)

Decasa is begin 2018 opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Casamance. De aanleiding voor de oprichting was dat veel (zowel gesponsorde als niet gesponsorde) projecten niet goed gecoördineerd en gevolgd worden, waardoor ze na een aantal jaren instorten of zich in verwaarloosde staat bevinden. Ook werd vastgesteld dat er een gebrek aan kennis is om projecten op een adequate wijze te managen en te beheren. Decasa wil, naast eigen ontwikkelingsinitiatieven ook eigenaarschap en ondernemerschap bij anderen bevorderen en een coördinerende rol vervullen door projecten met elkaar te verbinden. De ambitie is om over een aantal jaren in aanmerking komt voor het statuut van NGO (Niet Gouvernementele Organisatie).

Partnerschap


Om het partnerschap tussen Decasa en Stichting Bright Future for Children te formaliseren is een partnerschapsovereenkomst opgesteld. Daarin zijn wederzijdse verplichtingen opgenomen, die de samenwerking funderen en een juridisch kader geven, De titel van het project "SAAMA DEDA" ("de toekomst maak je zelf") werd aangeleverd door Decasa. Decasa wil hierin uitdrukken dat het voor de ontwikkeling van belang is om "de toekomst in eigen handen te nemen". (Buitenlandse) partners kunnen *tijdelijk* gewenste ontwikkelingen financieel ondersteunen, maar de gemeenschap zelf blijft verantwoordelijk voor de realisatie, de instandhouding en de ontwikkeling ervan.

Verantwoordelijkheidsverdeling

Overeenkomstig de partnerschapsovereenkomst is Stichting Bright Future for Children verantwoordelijk voor de financiering van het project en dus ook voor de daarvoor benodigde fondsenwerving. De vereniging Decasa van Abéné is lokaal verantwoordelijk voor de projectrealisatie en het daarbij horende projectmanagement. Decasa heeft één van haar leden als projectmanager aangesteld.

2. Projectorganisatie, informatievoorziening en controle.

Voor de realisatie van het project was de volgende projectorganisatie opgezet.

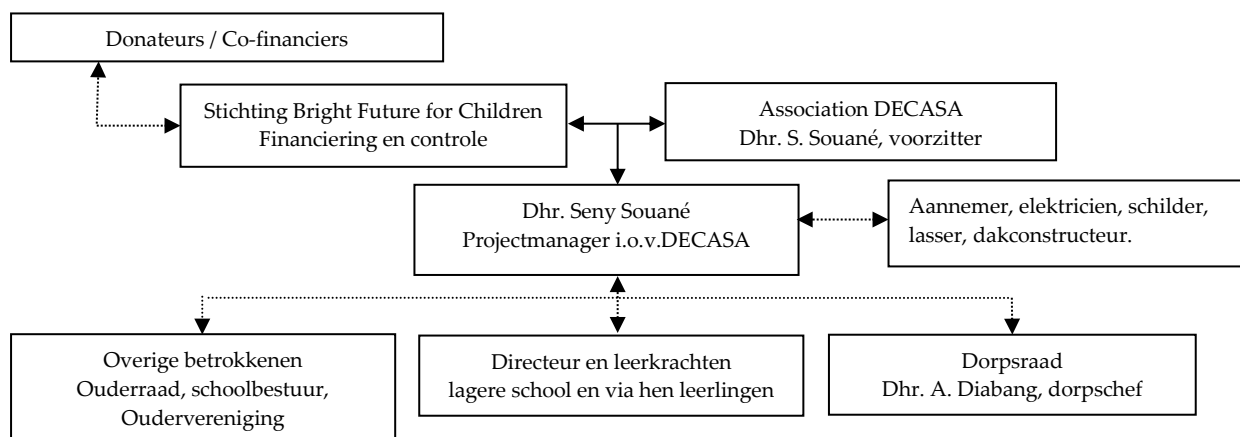

Actoren

1. Stichting Bright Future for Children en Decasa hebben in een partnerschapsovereenkomst vastgelegd dat ze zich zullen inspannen om in de wijk Medina een 2^e lagere school te bouwen om aan de stijgende onderwijsvraag te voldoen.
2. Stichting Bright Future for Children werft daartoe donateurs en fondsen van co-financiers en verantwoord zich aan hen over de besteding van de ter beschikking gestelde fondsen.
3. DECASA heeft dhr. S. Souané als projectmanager aangesteld om het project te realiseren en de realisatie te beheren volgens de overeengekomen kostenraming en planning. Hij plant de diverse werkzaamheden in overleg met de personen die deze werkzaamheden uitvoeren. Hij ziet toe op de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden en verantwoord zich over het realisatieproces en het resultaat zowel aan vereniging Decasa en aan Stichting Bright Future for Children.
4. De projectmanager informeert de dorpschef, de directeur en de overige betrokken organen. Alle betrokkenen kunnen hun mening geven over het project en aanvullende voorstellen doen. Deze worden door de projectpartners besproken en eventueel aan het meerjarenplan toegevoegd.

3. Projectcontrole

De secretaris van stichting Bright Future for Children verbleef in het voorjaar van 2024 in Abéné. In deze periode vonden meerdere voortgangsoverleggen plaats in verband met de doorlooptijd van het project. Ook werd de projectlocatie bezocht en werden reeds aanwezige facturen en betalingsbewijzen in relatie tot de begroting en de nog te verwachten kosten beproken.

Daarna waren niet meer in staat om het project te bezoeken. De controle vond daarom uitsluitend plaats aan de hand van foto's en facturen en betalingsbewijzen. De voortgang werd (bijna) wekelijks via WhatsApp en e-mailberichten besproken.

4. Evaluatie

Ofschoon het project bijna binnen de begroting werd gerealiseerd en het resultaat ruimschoots aan onze verwachtingen voldoet zijn we wegens het herhaaldelijk verlengen van de doorlooptijd, toch niet helemaal tevreden met het projectverloop.
